


แบบฝึกหัด บทที่ 9

โครงการหนึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 9 กิจกรรม ซึ่งมีเวลาดำเนินงานดังนี้

กิจกรรม	กิจกรรมที่ต้องทำก่อน	เวลาดำเนินงาน (วัน)
A	-	5
B	A	3
C	B	2
D	B	4
E	A	6
F	D, E	5
G	C, F	7
H	E, F	9
I	G, H	3

- 1) จงเขียนข่ายงาน
- 2) โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน
- 3) กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมวิกฤต
- 4) กิจกรรมที่ล่าช้าได้ และสามารถล่าช้าได้เท่าไร

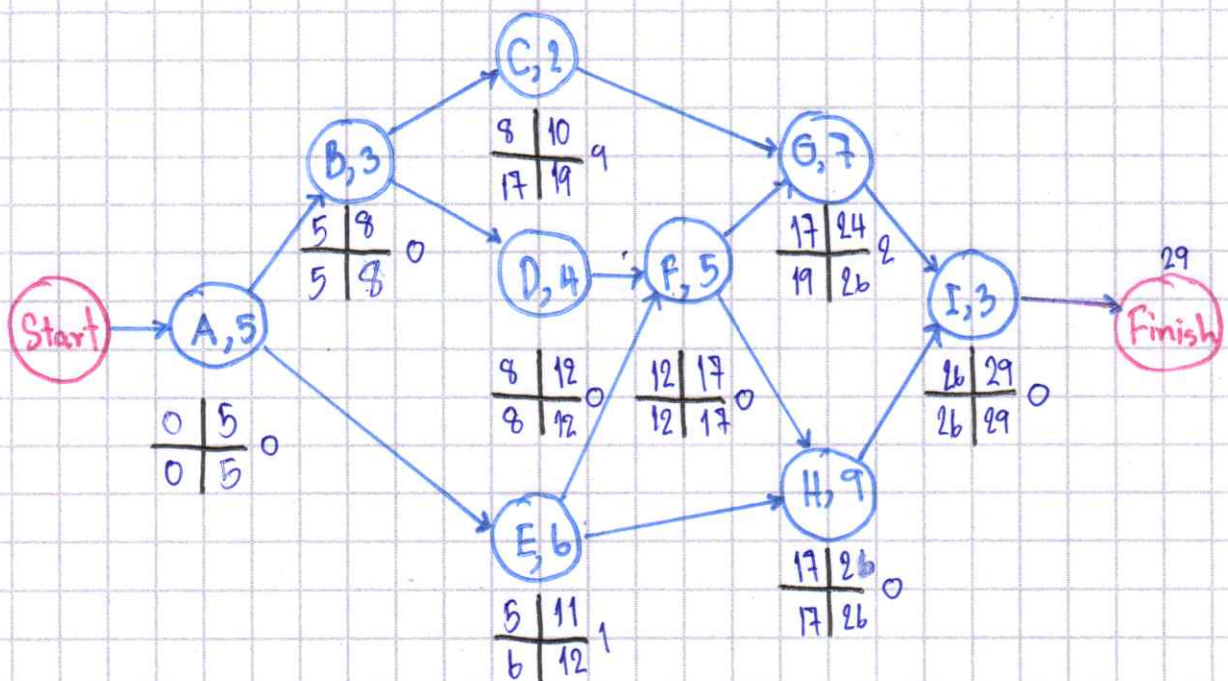

Ans :

- โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมด 29 วัน
- กิจกรรมวิกฤต (TF=0) ได้แก่ กิจกรรม A, B, D, F, H, I
- กิจกรรมที่ล่าช้าได้ ได้แก่ กิจกรรม C, E, G
 - โดยกิจกรรม C ล่าช้าได้ 9 วัน
 - กิจกรรม E ล่าช้าได้ 1 วัน
 - กิจกรรม G ล่าช้าได้ 2 วัน
